

## ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 317

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 25 de noviembre de 2021, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Sr. Carlos DEPASCALE; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Morón:** Sra. Patricia CALABRES; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRAN; **Presidente Perón:** M.M.O. Gloria GOMEZ; **San Martín:** Srta. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Tres de Febrero:** Arq. Maximiliano FEOLA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUZI; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Sergio BENET; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH):** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación; el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANON y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/09/21 al 08/01/22,

será responsabilidad del Municipio de Merlo la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Moreno la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**  
**REUNION DE COMISION ASESORA**  
**25/NOV/21**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

**B) OBRAS:**

1. Presentación a cargo de AySA sobre Estado de Proyectos y Obras.
2. Informe de la "Subcomisión de Calidad de Materiales".

**C) VARIOS:**

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A) 1.** Ante la ausencia del Representante de Moreno, se acuerda que será reemplazado

por el Representante del Municipio Ituzaingó en la Secretaría de Actas. Seguidamente, se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

**A) 2 informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).**

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):
  - Del 12 de noviembre al 12 de diciembre: San Fernando

**A) 3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).**

Designados:

- Municipio de José C. Paz
- Municipio de San Miguel

**B) 1. Presentación a cargo de AySA sobre: Estado de situación: Obras en ejecución contratadas y en licitación. Octubre 2021.**

Realiza la exposición:

- *Ing. Juan José COLOMBO – Gerente de Programación y Seguimiento - DCySPMOEM*
- *Ing. Fernando DOPAZO – Gerente de Coordinación MyM - DCySPMOEM*

**Plan de Obras:**

En 2019 se aprobó la revisión quinquenal 2019-2023 del PMOEM que contiene al Plan DIRECTOR DE EXPANSIÓN Y MEJORAS, incluyendo todos los proyectos ejecutados y a ejecutar en la concesión.

En 2021, en cumplimiento a lo requerido por la Comisión Asesora de APLA al momento

de aprobar la revisión quinquenal del PMOEM, AySA elaboró y presentó la actualización 2021/2023 de la revisión del PMOEM, la cual fue oportunamente aprobada por la comisión Directora y el Directorio de APLA.

Resumen general al 31-10-2021. Agua Potable – Desagües cloacales:

**Obras en Licitación:** 42 obras. Monto: 77.496 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 151.581.

**Obras Contratadas:** 44 obras. Monto: 12.205 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 125.323.

**Obras en ejecución:** 196 obras. Monto: 189.615 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 721.319.

**Principales Obras Finalizadas 2020-2021:**

- Mejoras en Planta San Martín (PSM): Canal Auxiliar de Agua Decantada
- Acueducto Escobar 2° Etapa
- Cisterna de Agua Cruda con Rebombéo en Planta de Ósmosis Inversa (POI) Virrey del Pino
- Renovaciones de RSA en Matanza Norte
- Puesta en Servicio Primarias Agua y RSA en Ituzaingó
- Puesta en servicio de módulos A+T Sistema Glew
- Obras Primarias y Secundarias de Cloaca en Ing. Maschwitz
- Colector Pacheco en Tigre
- Ampliación EBC William Morris y Colector Soto en Hurlingham
- Colector, EBC e Impulsión Nuevo Ituzaingó, y Colector MartínRodríguez Tramo I
- Primarias Ezeiza Tramo Esteban Echeverría
- Puesta en valor Pta. Depuradora Presidente Perón

**Comentarios:**

En la presentación no se incluyen obras por cuenta de terceros (OPCT) - DIPAC, ENOHS, MUNICIPIO, PROMEB, PROCREAR.

Los habitantes consideran beneficiarios directos (sólo las Redes Secundarias).

**CABA – Obras contratadas y en ejecución:**

Agua Potable: Cantidad de obras: 4. Monto: 690 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 14.392.

Desagüe Cloacal: Cantidad de obras: 1. Monto: 143 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 5.800.

Contratadas recientemente: Refuerzo de Agua Lafuente - Renovación RSA – Belgrano y Caballito – Decreto220.

Principales obras en curso: Mejoras en PSM – Sistema de Agua de Cal - Renovación RSA Belgrano y Caballito 2 – Decreto220 (finalizada recientemente) - Sistema Riachuelo – Colector Margen Izquierda - Renovación RSC – Belgrano y Caballito.

Finalizadas recientemente: Aliviador Cloacal Ramos Mejía.

**NORTE – Obras contratadas y en ejecución:**

Agua Potable:

Escobar: Cantidad de obras: 11. Monto: 2.762 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 21.472.

Malvinas Argentinas: Cantidad de obras: 3. Monto: 1.965 millones de pesos c/IVA.

Pilar: Cantidad de obras: 3. Monto: 101 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 5.812.

San Fernando: Cantidad de obras: 2. Monto: 438 millones de pesos c/IVA.

San Isidro: Cantidad de obras: 1. Monto: 367 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 13.763.

San Martín: Cantidad de obras: 6. Monto: 1.121 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 29.668.

San Miguel: Cantidad de obras: 67 Monto: 2.718 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 21.283.

Tigre: Cantidad de obras: 16. Monto: 2.633 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 65.021

Vicente López: Cantidad de obras: 1 Monto: 304 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 20.500.

Desagüe Cloacal:

José C.Paz: Cantidad de obras: 1. Monto: 65 millones de pesos c/IVA.  
Malvinas Argentinas: Cantidad de obras: 1. Monto: 135 millones de pesos c/IVA.  
Habitantes: 1547.  
Pilar: Cantidad de obras: 1. Monto: 505 millones de pesos c/IVA.  
San Fernando: Cantidad de obras: 1. Monto: 209 millones de pesos c/IVA.  
San Isidro: Cantidad de obras: 1. Monto: 122 millones de pesos c/IVA. Habitantes:  
12.757.  
San Miguel: Cantidad de obras: 1. Monto: 90 millones de pesos c/IVA.  
Tigre: Cantidad de obras: 16. Monto: 6.532 millones de pesos c/IVA. Habitantes:  
159.884.  
Vicente López: Cantidad de obras: 2. Monto: 221 millones de pesos c/IVA. Habitantes:  
1.100.  
Varios: Cantidad de obras: 1. Monto: 105 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 4.264.

Contratadas recientemente:

ESCOBAR: RPA Ing. Maschwitz 2, RPA El Cazador y EscobarCentro 2, y RSA Escobar Centro

MALVINAS ARGENTINAS: Cisterna M. Argentinas (Hipopuelche), RPA yRefuerzos M. Argentinas, y RSC Villa De Mayo 1

SAN ISIDRO: Aliviador Cloacal Calle Figueroa Alcorta

SAN MIGUEL: Centro de Mezcla Muñiz y Renovación RSA Muñiz

TIGRE: RPA Alimentación a Ing. Sourdeaux I, RSA TalarSur, Ricardo Rojas M4, RSC Benavidez 2 zona C, y3, 20 De Julio Este, y Oeste Área 1, ReconquistaResto

VARIOS: Instalación de Cañerías de Agua y Colectora. Faltantes (2 contratos A y C).

Principales obras en curso:

ESCOBAR: Acueducto Terminación 1° Etapa, RPA Escobar Centro

JOSE C. PAZ: Readecuación y Puesta en Valor PDLC Centro

MALVINAS ARGENTINAS: Impulsión Grand Bourg

PILAR: Readecuación y Puesta en Valor PDLC Champagnat

SAN FERNANDO: RPA Refuerzo Aeropuerto San Fernando, Optimización Módulos I y II  
PDLC Norte

SAN MARTIN: RSA Villa Hidalgo

SAN MIGUEL: Interconexión de Pozos y RPA San Miguel Centro, Re potenciación EBC  
Lebensohn

TIGRE: RSA Benavidez I, RSC Esperanza y Pueblo Nuevo

VICENTE LOPEZ: Nuevo Colector Yrigoyen.

Finalizadas recientemente:

JOSE C. PAZ: Interconexión de Pozos Jose C. Paz Etapa 2

SAN MARTIN: RSC Suarez Este 1A a RPC JLS Este

TIGRE: RSC El Talar Area 1 y López Camelo Oeste 1

VICENTE LOPEZ: Terminación Nueva Colectora Roca

#### **OESTE – Obras contratadas y en ejecución:**

Agua Potable:

Hurlingham: Cantidad de obras: 2. Monto: 167 millones de pesos c/IVA.

Ituzaingó: Cantidad de obras: 3. Monto: 63 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 2.503

La Matanza: Cantidad de obras: 9. Monto: 1.462 millones de pesos c/IVA. Habitantes:  
26.436.

Merlo: Cantidad de obras: 4. Monto: 454 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 1.839

Morón: Cantidad de obras: 3. Monto: 89 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 1.281

Tres de Febrero: Cantidad de obras: 3. Monto: 702 millones de pesos c/IVA.  
Habitantes: 27.320.

Varios: Cantidad de obras: 1. Monto: 196 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 1.600

Desagüe Cloacal:

Hurlingham: Cantidad de obras: 2. Monto: 2.284 millones de pesos c/IVA. Habitantes:  
610.

Ituzaingó: Cantidad de obras: 1. Monto: 67 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 1.255.

La Matanza: Cantidad de obras: 3. Monto: 4.375 millones de pesos c/IVA. Habitantes:

1.310.

Merlo: Cantidad de obras: 2. Monto: 28 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 6.666

Moreno: Cantidad de obras: 1. Monto: 314 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 15.474

Tres de Febrero: Cantidad de obras: 3. Monto: 218 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 1.438

Contratadas recientemente:

LA MATANZA: Renovación RSA San Justo - RPC Aliviador La Matanza Norte 3° Etapa

MERLO: Cámara Reguladora (CR) Refuerzo Merlo

VARIOS: Instalación de Cañerías de Agua Faltantes Etapa 1LM-MO-TF.

Principales obras en curso:

HURLINGHAM: Puesta en Servicio Primarias Impulsión Hurlingham Tesei, CR Calle Valencia, y Ampliación PDLCHurlingham

ITUZAINGO: RPA Udaondo I, y RSC Pque. Leloir – Martin Fierro

LA MANTANZA: Bombeo de Salida Virrey Del Pino y Rebombeo Castillo, Tratamiento de Barros PDLC Sudoeste

MERLO: Refuerzo Merlo, Hipopuelche Estación de Rebombeo Merlo, RSA B° Malvinas Argentinas

MORENO: RSC San Cayetano I

MORON: Terminación CR Sarachaga, y RSA Resto B° Paz

TRES DE FEBRERO: Renovación RSA Caseros, Aliviador Raffo y Ejercito de Los Andes E1, y RSC Loma Hermosa Sur 2ª.

Finalizadas recientemente:

HURLINGHAM: CR Calle Bizet - Ampliación EBC e Impulsión William Morris

ITUZAINGO: RSA Ituzaingó 4A – Resto III - EBC Nuevo Ituzaingó

LA MATANZA: RPA Vinculación Acueducto con Batería Las Nieves EII, RSA B° Nuestro Futuro (A+T) Módulos C+T Castillo 5 Noroeste

MORON: Sistema de Regulación Merlo Gómez e Ituzaingó I

TRES DE FEBRERO: Aliviador Ejercito de Los Andes Etapa 2.

## **SUDESTE – Obras contratadas y en ejecución:**

Agua Potable:

Avellaneda: Cantidad de obras: 7. Monto:2.248 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 36.770.

Florencio Varela: Cantidad de obras: 4. Monto:673 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 6.910.

Lanús: Cantidad de obras: 3. Monto: 301 millones de pesos c/IVA. Habitantes:24.043.

Quilmes: Cantidad de obras: 6. Monto: 1.093 millones de pesos c/IVA. Habitantes:40.919

Varios: Cantidad de obras: 1. Monto: 150 millones de pesos c/IVA. Habitantes:2.200

Desagües Cloacal:

Avellaneda: Cantidad de obras: 9. Monto: 1.167 millones de pesos c/IVA. Habitantes:2.375

Florencio Varela:Cantidad de obras: 2. Monto: 119 millones de pesos c/IVA. Habitantes:1.480

Lanús:Cantidad de obras: 6. Monto: 1.784 millones de pesos c/IVA. Habitantes:24.176

Quilmes: Cantidad de obras: 2. Monto: 60 millones de pesos c/IVA. Habitantes:4.115

Varios:Cantidad de obras: 1. Monto: 166 millones de pesos c/IVA. Habitantes:4.260

Contratadas recientemente:

AVELLANEDA: RPA Refuerzo Avellaneda Etapa 2, y VillaInflamable - RPC Obrero Norte, y Instalación de CañeríasColectoras Faltantes

FLORENCIO VARELA: Interconexión de Pozos Gdor. Costa y 2º EtapaSelenio- RPC Impulsión Barrio San Jorge

LANUS: Renovación RSA Remedios De Escalada y LanúsCentro - RPC Colector Eden, RPC O'Brien (contratadarecientemente), y RSC Siam, y Caraza 1 Resto

VARIOS: Instalación de Cañerías de Agua y ColectoraFaltantes LAN-QUI.

Principales obras en curso:



AVELLANEDA: RPA La Saladita, Renovaciones RSA (Gerli-Pineyro y Wilde), Sistema Riachuelo (Planta, Emisario y CMI), EBC Cristóbal Colon, EBC Gral. Sarmiento, y Colector + EBC + Impulsión Montes de Oca

FLORENCIO VARELA: Interconexión de Pozos Florencio Varela Etapa 1

LANUS: Terminaciones RSC Monte Chingolo Este y módulos Internacional Norte

QUILMES: Sistema Agua Sur (Ampliación Capacidad Pta. Bernal y Rio Sur Tramo 1), Renovaciones RSA (Quilmes Este y San Francisco Solano), y RSA Barrio Azul.

Finalizadas recientemente:

AVELLANEDA: RPA Villa Tranquila, B° Alianza e Isla Maciel Etapa 1 y 3, y Cierres de Malla Sta. Catalina 2 - 4 de Febrero – Tierra Santa Tierra Verde – Pque. Dominico - RSC Obrero Sur Resto M1

LANUS: RSC Güemes Oeste.

#### **SUDOESTE – Obras contratadas y en ejecución:**

Agua Potable:

Almirante Brown: Cantidad de obras: 9. Monto: 525 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 27.773

Esteban Echeverría: Cantidad de obras: 3. Monto: 694 millones de pesos c/IVA.

Ezeiza: Cantidad de obras: 2. Monto: 81 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 1.528

Lomas de Zamora: Cantidad de obras: 6. Monto: 967 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 24.153

Varios: Cantidad de obras: 1. Monto: 89 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 3.500.

Desagüe Cloacal:

Almirante Brown: Cantidad de obras: 911 Monto: 2.147 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 42.120

Esteban Echeverría: Cantidad de obras: 5. Monto: 769 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 24.041

Lomas de Zamora: Cantidad de obras: 15. Monto: 8.165 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 95.164

Presidente Perón: Cantidad de obras: 2. Monto: 379 millones de pesos c/IVA.

Varios:Cantidad de obras: 1. Monto: 73 millones de pesos c/IVA. Habitantes:720.

Contratadas recientemente:

ALMIRANTE BROWN: Impulsión Esperanza Oeste, RSC Esperanza Oeste1

EZEIZA: Perforación en Hipopuelche Planta Ezeiza

LOMAS DE ZAMORA: RPC Colector Banfield – Centenario, RSC Albertina 2

VARIOS: Instalación de Cañerías Colectora Faltantes Etapa 1LZ-AB-EZ.

Principales obras en curso:

ALMIRANTE BROWN: Hipopuelche en Pta. Glew, Renovación RSA AdroguéCentro 2, EBC Adrogué Sur 1 y Esperanza Oeste, RSCClaypole 3 y 1 Este, Burzaco Sur, y Adrogué Sur 1

ESTEBAN ECHEVERRIA: RPA Refuerzos 9 de Abril Etapas 1 y 2 - RSC El Jagüel 2 Etapas 1, 2 y 3

EZEIZA: RSA B° ATE M1

LOMAS DE ZAMORA: Rio Subterráneo Tramo 1 – EE 1, Hipopuelche CMLlavallol, Renovaciones RSA Lomas de Zamora,Primarias a PDLC Fiorito 2° Etapa – Fase A,Colector Budge, RPC Fiorito Llavallol Tramo 1, RSCFiorito 3, Budge, La Salada Norte y Sur, Turdera yLlavallol 2 Etapa 1, y Barrio Roldan

PRESIDENTE PERON: Revamping EBC Rucci y Colector Rucci Etapa 2.

Finalizadas recientemente:

ALMIRANTE BROWN: Interconexión de Pozos al Puelche Glew

ESTEBAN ECHEVERRIA: RSC Santa Catalina 4° Etapa

EZEIZA: RSC Ezeiza Norte Resto 1

LOMAS DE ZAMORA: RPC Aliviador Lomas de Zamora – Etapa 2

PRESIDENTE PERON: Puesta en Valor PDLC Pte. Perón ModII , y RPCColector Rucci Etapa 1.

**Obras en Licitación:**

Para Apertura de sobres: Cantidad de obras: 20. Monto: 52.137 millones de pesos c/IVA. Habitantes:58.224.

En análisis de oferta: Cantidad de obras: 16. Monto: 23.097 millones de pesos c/IVA. Habitantes:61.927

Para firma de contrato: Cantidad de obras: 6. Monto: 2.082 millones de pesos c/IVA. Habitantes: 31.430.

Principales Obras en Licitación:

CABA: Renovación e instalación RSA Barrios 1-11-14 y 21-24

ESCOBAR: RSC Barrio La Chechela

MALVINAS ARGENTINAS: RPA Interconexión de Pozos Grand Bourg Readequación y Puesta en Valor Planta Russo, y Planta Batallón (elevada recientemente)

TIGRE: Redes Primarias de Agua en Don Torcuato, y Redes Secundarias de Agua en Pueblo Nuevo y Lomas del Talar

ITUZAINGO: RPC Colector Martín Rodríguez Etapa 2

LA MATANZA: Renovación RSA en Ramos Mejía - Planta Depuradora Laferrere (150.000 habitantes)

MERLO: RSC Merlo Centro (contratada recientemente)

AVELLANEDA: RPC Colector e Impulsión La Saladita, y RSC Sarmiento 1° Etapa

FLORENCIO VARELA: EBC San Jorge, y Revamping y Ampliación Planta Florencio Varela

LANUS: RPA Refuerzo Villa Jardín Etapa 3, y Renovación RSA Lanús Este, y Oeste 2

QUILMES: RSC Las Piedras Sur Cuenca B

ALMIRANTE BROWN: RSC Esperanza Oeste 2 Longchamps

ESTEBAN ECHEVERRÍA: RSA Santa Isabel – Etapa 1

EZEIZA: RPC Primarias Ezeiza Tramo Ezeiza

LOMAS DE ZAMORA: Refuerzo y RSA Barrio Obrero, y Revamping EBC Llavallol

VARIOS: Planta Gral. Belgrano – Nueva Estación Elevadora de Agua Cruda - 1° Etapa Emisario y Estación de Bombeo Planta Berazategui.

## Sistema Riachuelo – Avance a Octubre 2021:

Componentes:

Lote1: Colector Margen Izquierda (CMI), Desvío Colector Baja Costanera (DCBC) y Obras Complementarias (OC): Avance económico a septiembre 2021: 96,00%

Túneles principales:

- El 14/11/2020 se completó el avance del túnel del CMI con una extensión de 9,5 km.
- El 15/09/2020 se completó el avance del túnel del DCBC con una extensión de 5,2 km.

Obras Complementarias:

- Se ha finalizada la construcción de los túneles de transporte con una extensión de 12,7 km.
- Se están ejecutando las obras de intercepción/derivación de pluviales y EBCs.

Captación Cloacas Máximas:

- Se encuentran en ejecución las obras de captación de la 2da y 3ra Cloacas Máximas y la derivación del Colector Costanero en Boca Barracas.

Lote 2: Planta de Pretratamiento (PPT), Estación Elevadora de Entrada (EEE), Estación de Bombeo de Salida (EBS): Avance económico a septiembre 2021: 40,47%.

Lote 3: Emisario Planta Riachuelo:

- El 22/11/2019 se completó el avance del túnel del Emisario (tramos de transporte y difusión, con una extensión de 12,0 km.
- Se completó la construcción de los 34 difusores y la colocación de sus correspondientes rosetas de difusión.
- Se están finalizando al construcción de la Cámara de Carga del Emisario.

Lote3: Emisario-Obras Complementarias: Enlace hidráulico y Obras viales: Avance económico a septiembre 2021: 89,07%

- Se encuentra en ejecución la obra de Enlace Hidráulico prevista como descarga de emergencia.
- Se completaron las obras viales de acceso a la planta y de mejora en vías de circulación al Polo Petroquímico de Dock Sud.

### **SISTEMA de Agua Sur (SAS) – Avance a Octubre 2021:**

#### **Componentes:**

- Toma de Agua Cruda en el Río de la Plata (SA849)
- Conducto Aducción de Agua Cruda (SA850)
- Estación Elevadora de Agua Cruda (SA852)
- Ampliación capacidad Planta Gral. Belgrano (SA851)
- Río Subterráneo a Lomas de Zamora (SA853/SA864) – Incluye la Estación Elevadora N° 1 en Lomas de Zamora.
- Redes Primarias de Agua desde la Estación Elevadora N°1: Impulsión Glew (SA70054). Impulsión Temperley (SA761)
- Río Subterráneo a Esteban Echeverría (SA70075)- Incluye la Estación Elevadora N° 2 en Esteban Echeverría.
- Redes Primarias de Agua desde la Estación Elevadora N° 2: Impulsión Pta.Unión-Pta. La Lata (SA70067). Impulsión Esteban Echeverría – La Matanza (VA70002).

Planta Gral. Belgrano: Avance Físico a octubre 2021: 34,50%. Avance económico a octubre 2021: 39,31%.

Las obras de ampliación de la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano, tienen como objetivo elevar la capacidad de producción de agua de la Planta del máximo actual de 1.950.000 m<sup>3</sup>/día a 2.850.000 m<sup>3</sup>/día.

Obras de ampliación: 3 módulos nuevos; cada módulo estará conformado por 3 sectores de floculación, 3 sectores de decantación y 8 filtros.

En forma complementaria, para lograr la capacidad total proyectada, se necesitará la ejecución de las siguientes obras:

- Toma de Agua Cruda en el Río de la Plata – SA849

- Conducto Aducción de Agua Cruda – SA850
- Estación Elevadora de Agua Cruda – SA852

Hasta que se ejecuten las obras relacionadas con la nueva toma y la estación elevadora de agua cruda, la capacidad de la Planta Gral. Belgrano sólo se incrementará un porcentaje del total proyectado, siendo 350.000 m<sup>3</sup>/día con la finalización del 1° módulo.

Río Subterráneo a Lomas – Estación Elevadora N° 1: Avance físico a octubre 2021: 35,46%. Avance económico a octubre 2021: 49,70%.

Túnel tramo 1: Durante septiembre se instalaron 283 anillos, siendo el total de avance acumulado de 3.463 m correspondiente a 2.474 anillos.

**B) 2.** Toma la palabra el Lic. Jorge MORENO a fin de hacer una síntesis de lo actuado en relación al tema de referencia:

En primera instancia, con fecha 28 de octubre de 2021 – ACTA CA N° 315, la concesionaria expuso y distribuyó ante la Comisión Asesora el “Listado de Materiales y normativas Asociadas año 2021”.

En este sentido, y a fin de analizar la información remitida con fecha 11 de noviembre de 2021 se reunió la “Subcomisión de Calidad de Materiales” con la presencia de: Itzaingó, Tigre, Provincia de Buenos Aires, AySA y APLA.

Al respecto, habiendo sido analizado el listado de materiales, la “Subcomisión” prestó conformidad al listado presentado, no encontrando observaciones que realizar al mismo.

Con lo informado, el Cuerpo Asesor considera pertinente someter a votación la siguiente moción: “Aprobar en el ámbito de Comisión Asesora la Actualización de Listado de Materiales y normativas Asociadas año 2021”; se aprueba por unanimidad. El mismo obra como anexo de la presente Acta acompañando a la minuta de la “Subcomisión de Calidad de Materiales” de fecha 11 de noviembre del 2021.

La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales realizará las gestiones administrativas para la continuación del trámite correspondiente.

**C) VARIOS:**

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

**JOSE C. PAZ:**

*-Solicita información del estado de avance de las obras de rehabilitación y puesta en servicio de la PDLC Centro.*

NC70194 - Readecuación y puesta en valor de Planta de Tratamiento Centro - Estado: en Ejecución - Financia: AySA - Contratista: Veolia servicios y gestión de ingeniería Argentina S.A.U - AF 31oct21: 47%.

El proyecto contempla

- La realización del Proyecto Ejecutivo.
- El vaciado y limpieza de las unidades.
- Verificación, desobstrucción y reparación de las cañerías existentes de la unidad (ya sean cañerías de conducción de líquidos y/o de barros).
- Tratamiento de superficies recipientes y estructuras.
- Reemplazo de la totalidad de los difusores existentes por nuevos difusores de burbuja fina.
- Reparación del puente barredor del clarificado.
- Readecuación y puesta en valor de las instalaciones de provisión de energía.
- Provisión, supervisión y montaje Electromecánico en el lugar de la obra.
- Instalación de servicios necesarios y pruebas pre-operacionales.-
- La puesta en marcha de la obra y equipos, incluyendo la capacitación del personal.

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

Municipio de Ituzaingó solicita información de fecha de puesta en servicio y habilitación de la EBC Nueva Ituzaingó.


Municipio de San Miguel solicita información del alcance de las cuencas cloacales a ser servidas por la futura PDLC Campo de Mayo, si se incluyen áreas del Partido de San Miguel. Y solicita información estado del proyecto NC70183 Colector Catonas.

Municipio de Morón solicita información proyecto OA70063 y solicita información proyecto OC70207.


Municipio de Hurlingham solicita información de fecha de puesta en servicio y habilitación de la EBC Williams Morris.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Agenda de Temas y Consultas Generales.

Siendo las 12:30hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 02 de diciembre de 2021.




Secretario Coordinador Merlo




P/A Secretario de Actas Ituzaingó



Esteban María Pincemin  
DIR. DE INFRAESTRUCTURA  
Subsecretaría de Servicios Concesionados  
Municipalidad de San Miguel  
Municipio de San Miguel




Municipio de José C. Paz




Ing. VICENTE MORGIONE  
DIRECTOR  
Municipalidad de José C. Paz

Agencia de Planificación:

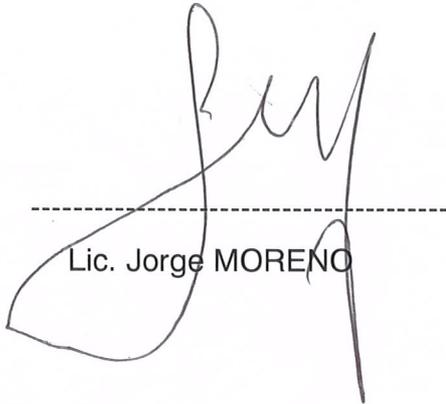

Lic. Jorge MORENO



Lic. Leonardo PAGANONI
